

Munkabeszámoló

Munkálat megnevezése:	Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes kovácsoltvas osztói és behelyezése
Tulajdonos:	Bögözi Református Egyházközség, Bögöz
Beruházó:	Új Ezredév Alapítvány, Budapest
Felújítást vezető tervező:	Atelier M Kft, Benczédi Sándor Műemlékvédelmi szakmérnök
Kivitelezés	
Konzerválási- restaurálási munkálatok:	Ars Antiqua Kft, Marosvásárhely, Nagy Benjámin, Szobrász-restaurátor

A bögözi Református műemléktemplom kőrestaurálási munkálatait az épület általános felújítása során végeztük el, a jóváhagyott kőrestaurálási kivitelezési szakmai terv alapján.

A faragott kőelemek konzerválásának illetve restaurálásának ütemezése szervesen kapcsolódott az építészeti munkálatok által megkívánt sorrendhez, amelyet 2013-ban végeztünk el.

A 2014-ben elvégzett munkálatok, a korábban konzervált és restaurált gótikus ablakok további munkálatai: a már rekonstruált függőleges osztók behelyezése, valamint a kovácsoltvas vízszintes osztók elkészítése és behelyezése. Mivel a terv szerint ólómkeretes ablaküvegek zárják a faragott kőkeretek nyílásait, ezért szükség volt a gótikus ablakkeretek teljes rekonstrukciójára.

Munkafázisok:

A függőleges osztók műköből készültek, figyelembe véve az eredeti andezit kőzet tulajdonságait: szín, szerkezet, felületi megmunkálás, hogy minél jobban illeszkedjen az eredeti faragott kövek környezetébe.

A kovácsoltvas elemeket, mint vízszintes osztókat, a megrajzolt terv szerint kivitelettük, figyelembe véve más analógiákat is.

Miután a kő illetve kovácsoltvas rekonstrukciók műhelyben elkészültek, következett a helyszínen való behelyezésük.


Ez részleges állványépítést igényelt, a gótikus ablakok előtt.

Az elemek behelyezését követően, ideiglenesen, méretre vágott polikarbonát lapokkal zártuk a nyílásokat, az ólomkeretes üvegek elkészüléséig. Ezzel párhuzamosan precíz sablonozást végeztünk, az ülümkeretes üvegek gyártásához.

Az ólomkeretek behelyezésekor újra fölállványoztuk a gótikus ablakkeretek előtti részeket. Az ólomkeretes ablaküvegek behelyezése, valamint habarccsal való körbefugázása a gyártó cég által lett kivitelezve.





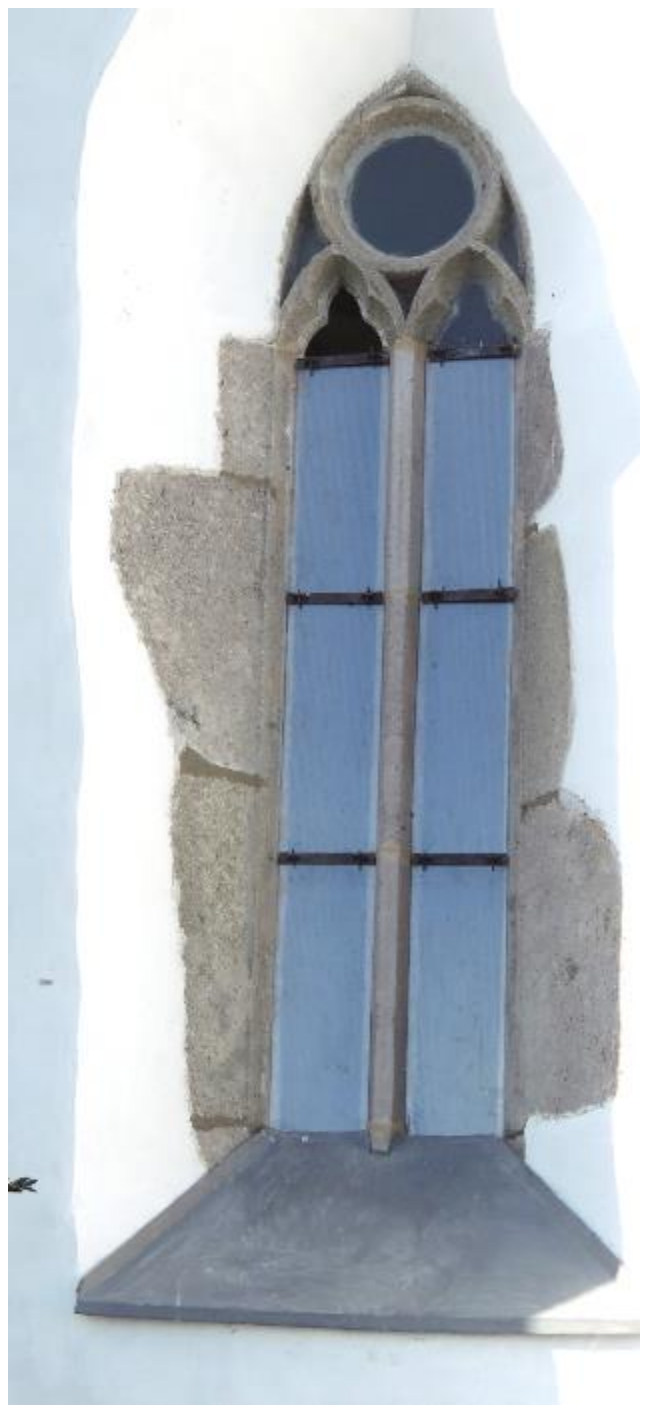













Jelen munkabeszámoló és a hozzá tartozó pénzügyi beszámoló az Új Ezredév Alapítvány által támogatott, 2014-es munkafolyamatokra vonatkozik.

Köszönettel a támogatónak és lebonyolítóknak,
Nagy Benjámin, Szobrász-restaurátor
Ars Antiqua Kft, Marosvásárhely

